



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI, TAPASZTALATAI


SZABÓ CSABA
FŐOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYMINISZTERIUM
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

INFÓNAP BÉKÉS MEGYEI POLGÁRMESTEREK SZAKMAI
FÓRUMA
2021. NOVEMBER 11.

A megye számlabenyújtási előrehaladása

Számlabenyújtási előrehaladás

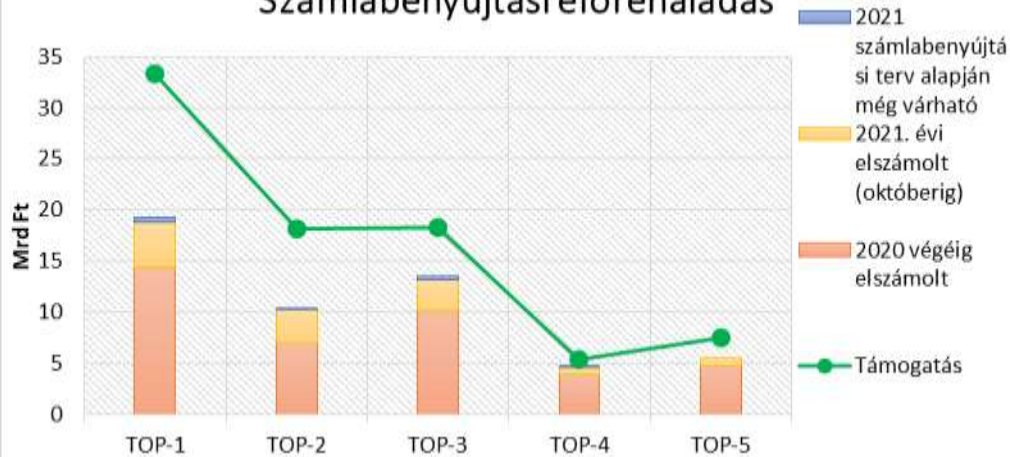


Prioritás	Támogatás	2020 végéig elszámolt	2021. évi elszámolt (októberig)	2021 számlabenyújtási terv alapján még várható	Prioritás összesen ténybenyújt.
TOP-1	33,28	14,43	4,31	0,52	18,74
TOP-2	18,14	6,97	3,26	0,15	10,23
TOP-3	18,28	10,18	2,93	0,35	13,11
TOP-4	5,35	3,89	0,68	0,06	4,57
TOP-5	7,44	4,76	0,75	0	5,51
Végösszeg	82,49	40,23	11,94	1,08	52,17

Táblázat: 2021. évi számlabenyújtás előrehaladása

Prioritás	TERV	TÉNY	Még várható
TOP-1	4,83	4,31	0,52
TOP-2	3,41	3,26	0,15
TOP-3	3,28	2,93	0,35
TOP-4	0,74	0,68	0,06
TOP-5	0,71	0,75	0
Összesen	12,97	11,93	1,08

2021. év számlabenyújtások

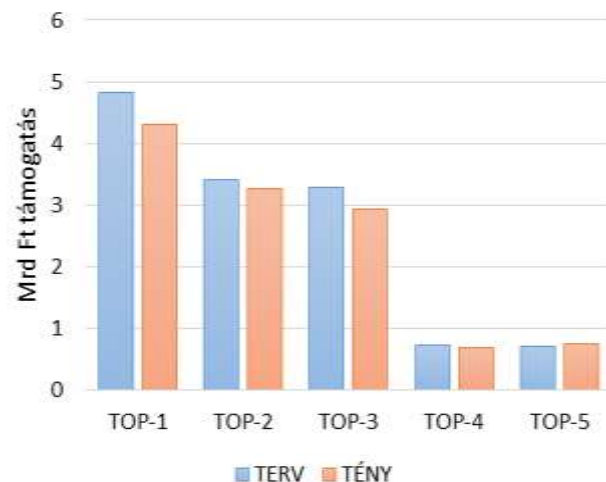


Kérjük a **számlák folyamatos benyújtását** -> tagállami elszámolási kötelezettség az EU felé!

Minden község/szervezet köteles a **támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket** tartalmazó kifizetési igénylést **november 1-ig elszámolásra benyújtani**.

Az év végéig felmerülő további számlákat is kérjük benyújtani folyamatosan!

Prioritások előrehaladása a megyében

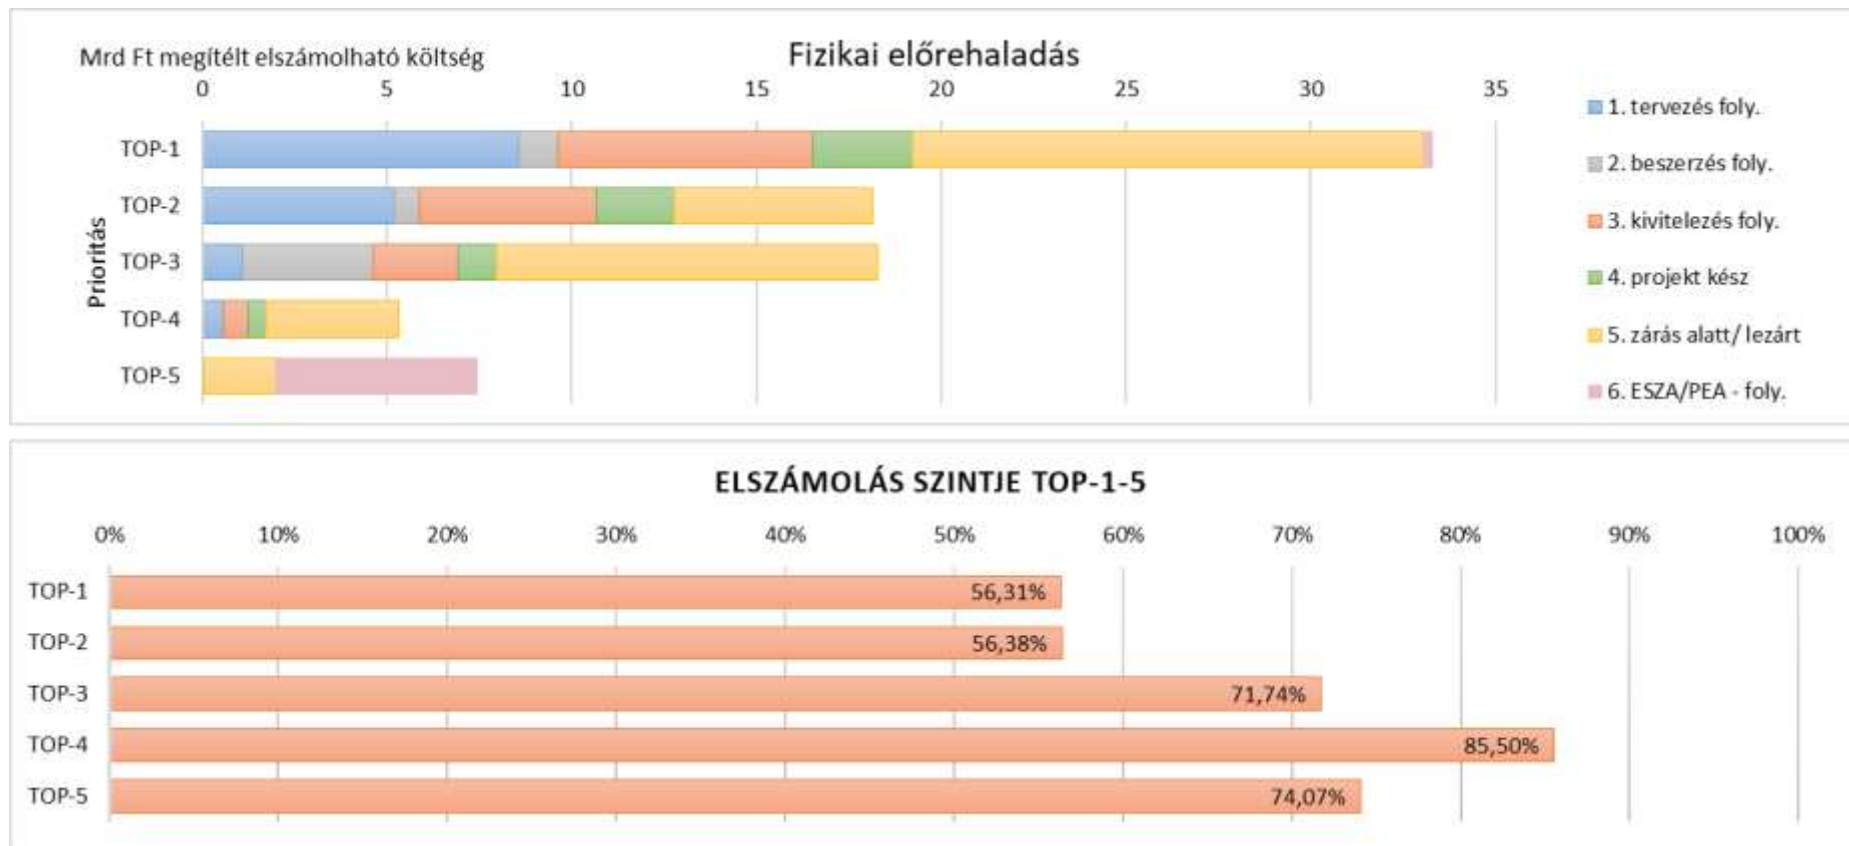


A felhívások előrehaladását vizsgálva látszik, hogy a TOP-4 prioritás elszámolási szintje kimagasló, 85% feletti, ami annak köszönhető, hogy a támogatott 78 projekt közül 70 már fizikailag megvalósult.

A TOP-1 és a TOP-2 prioritásoknál látható a legtöbb tervezési fázissal érintett projekt, azonban a döntés évét vizsgálva megállapítható, hogy itt nagyarányú a 2020. és a 2021. évi támogatói döntés.

Megvalósítás előrehaladása, TOP-1 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

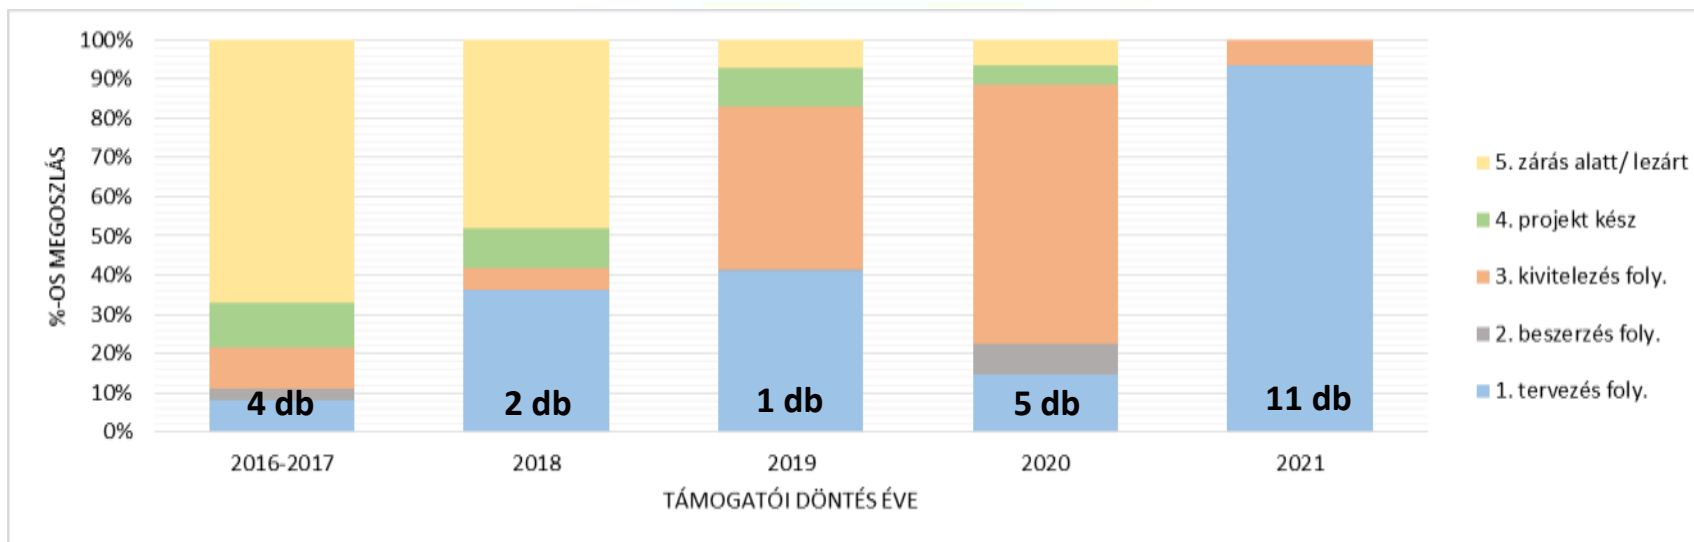


Békés	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
Fizikai előrehaladás	2016-2017	2018	2019	2020	2021
1. tervezés foly.	1 518 614 265	502 235 940	450 000 000	909 582 196	5 187 745 000
2. beszerzés foly.	550 000 001	0	4 000 000	481 968 504	0
3. kivitelezés foly.	1 994 563 931	75 000 000	453 916 696	4 050 409 549	350 000 000
4. projekt kész	2 144 654 872	140 000 000	107 556 427	319 796 934	0
5. zárás alatt/ lezárt	12 682 902 942	663 540 253	77 279 559	388 501 724	0
Összesen	18 890 736 011	1 380 776 193	1 092 752 682	6 150 258 907	5 537 745 000


A TOP-1 prioritás felhívásainak előrehaladása

EUPR adatok a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-1

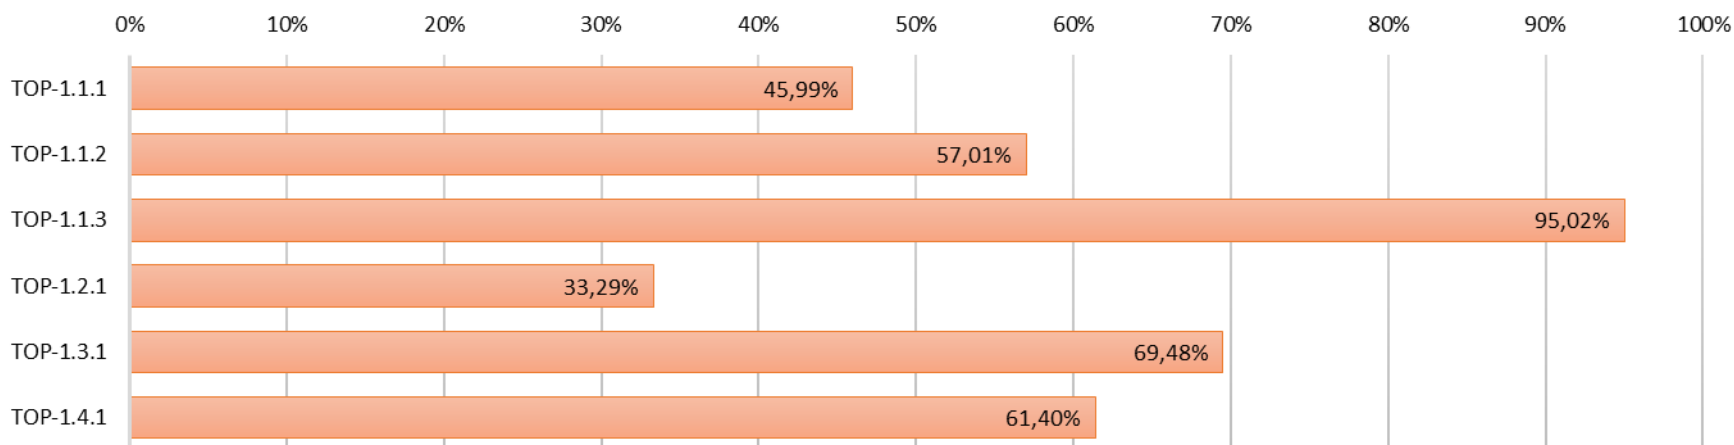

TOP-1.2.1 döntések

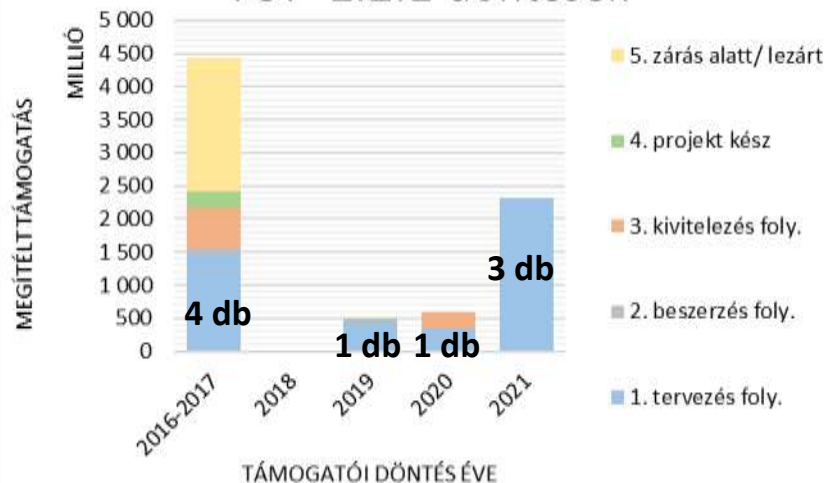


A TOP-1.2.1 felhívás 33%-os elszámolás szinten áll, melynek oka:

- VSZ-kötés előtt 9 db projekt, átlagosan 500 millió Ft támogatással
- min. VSZ-szel rendelkező 15 db projekt átlagosan 214 millió Ft támogatásúak
- nagyobb projektek megvalósulása lassabb, és nagyjösszegű a 2021.évi döntés is.

Megvalósítás előrehaladása, TOP-2 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

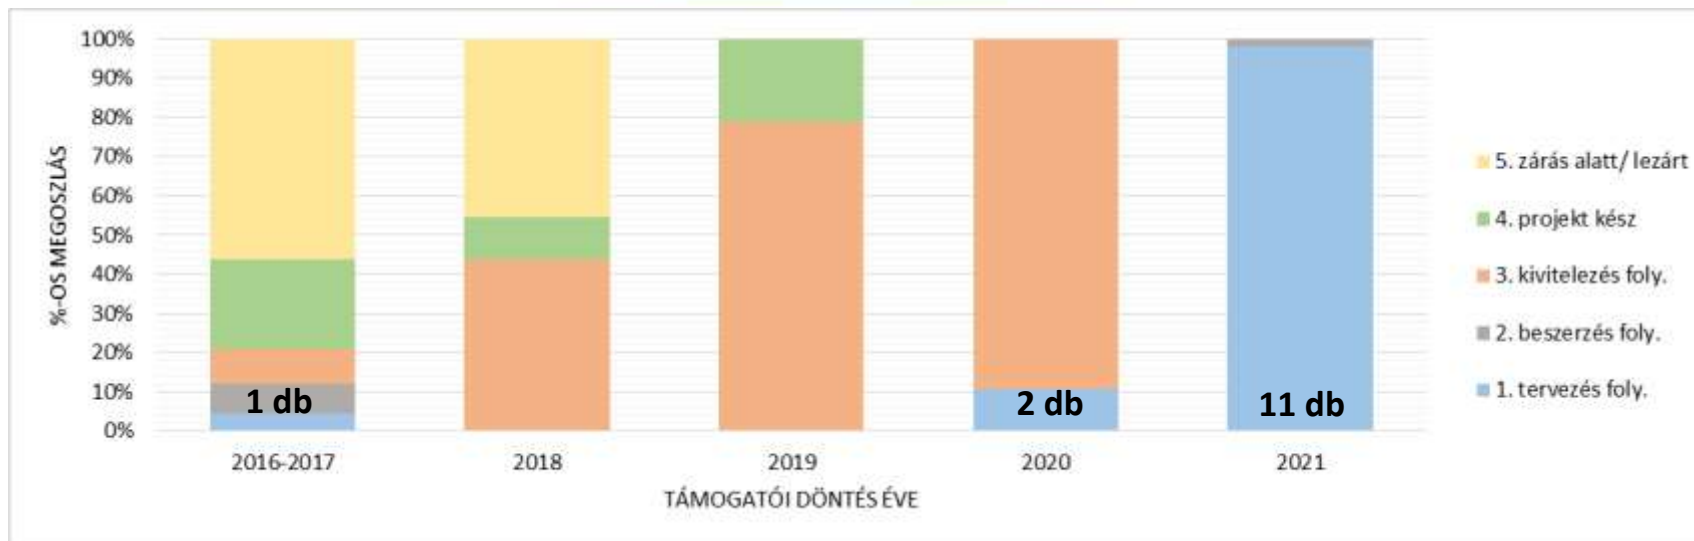


Békés	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
Fizikai előrehaladás	2016-2017	2018	2019	2020	2021
1. tervezés foly.	342 465 820	0	0	330 000 000	4 530 543 817
2. beszerzés foly.	600 000 000	0	0	0	88 900 000
3. kivitelezés foly.	705 261 321	899 340 937	396 545 035	2 770 995 460	0
4. projekt kész	1 800 646 262	220 000 000	106 988 646	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	4 420 417 401	932 031 641	0	0	0
Összesen	7 868 790 804	2 051 372 578	503 533 681	3 100 995 460	4 619 443 817


A TOP-2 prioritás felhívásainak előrehaladása

EUPR adatok és kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján


ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-2



TOP-2.1.1 döntések

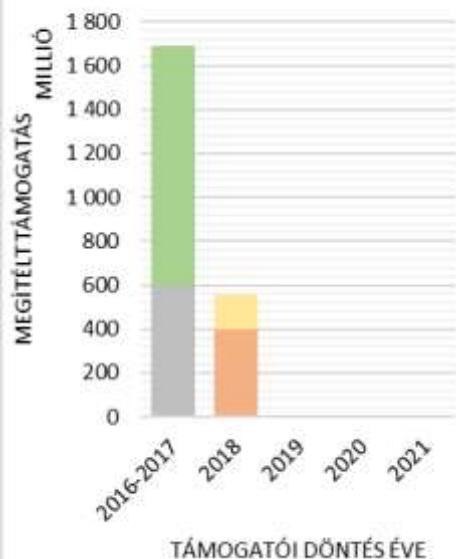

TOP-2.1.3 döntések

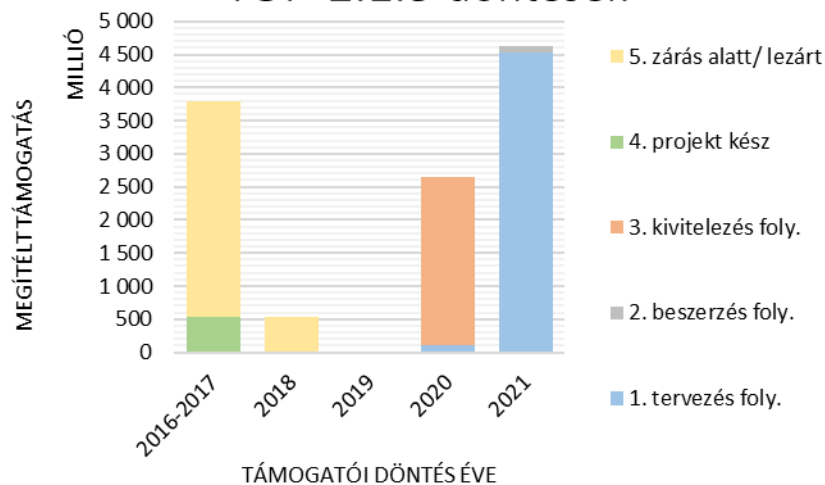

A TOP-2.1.1 esetében 5 db projekt támogatott:

- 2 db projekt a felhívás támogatásának 44%-a, ezek még csak 2% és 7% lehívási szinten vannak.

A TOP-2.1.3 felhívás 53%-on áll:


- nagyszámú 2020 és 2021. évi döntések;
- csak 2017-2018-at vizsgálva 99%-os az előrehaladás.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Megvalósítás előrehaladása, TOP-3 projektek



a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

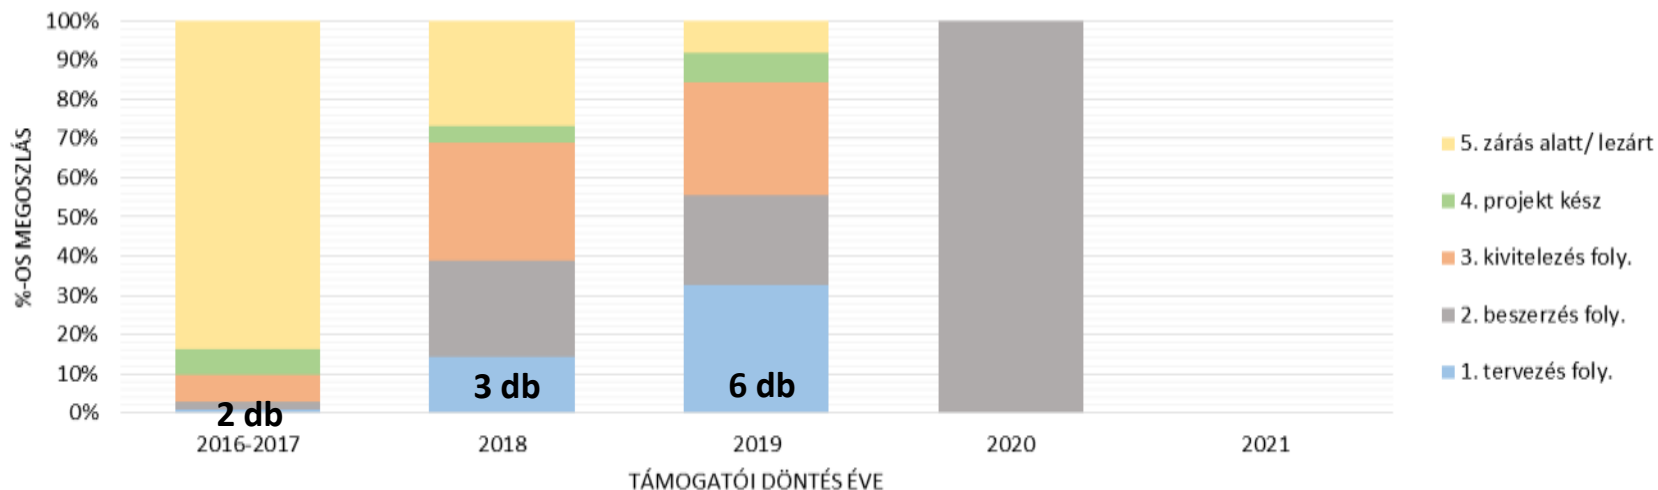

Békés	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
Fizikai előrehaladás	2016-2017	2018	2019	2020	2021
1. tervezés foly.	89 598 360	570 525 004	437 439 068	0	0
2. beszerzés foly.	237 815 357	957 906 428	310 000 000	2 017 854 730	0
3. kivitelezés foly.	740 578 018	1 190 444 687	387 576 496	0	0
4. projekt kész	732 253 924	172 796 288	102 237 332	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	9 168 751 119	1 054 733 182	108 877 154	0	0
Összesen	10 968 996 778	3 946 405 589	1 346 130 050	2 017 854 730	0

A TOP-3 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

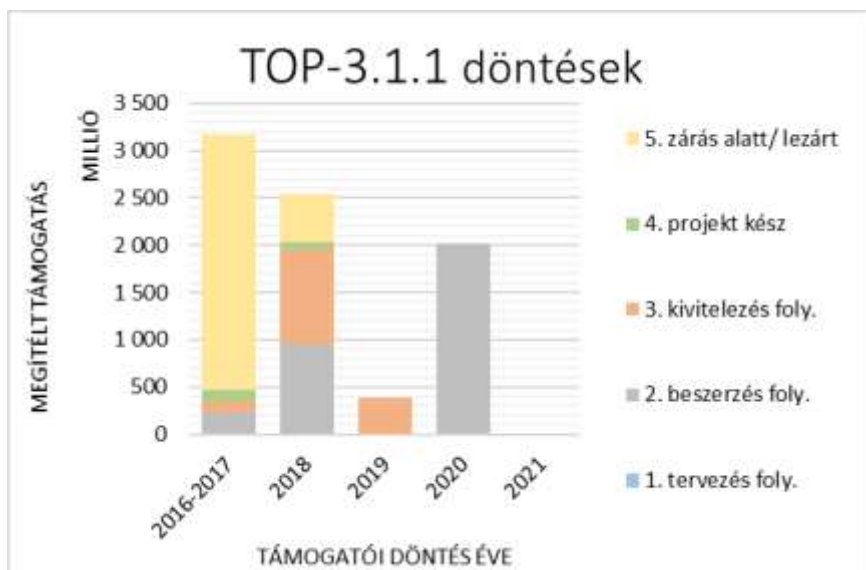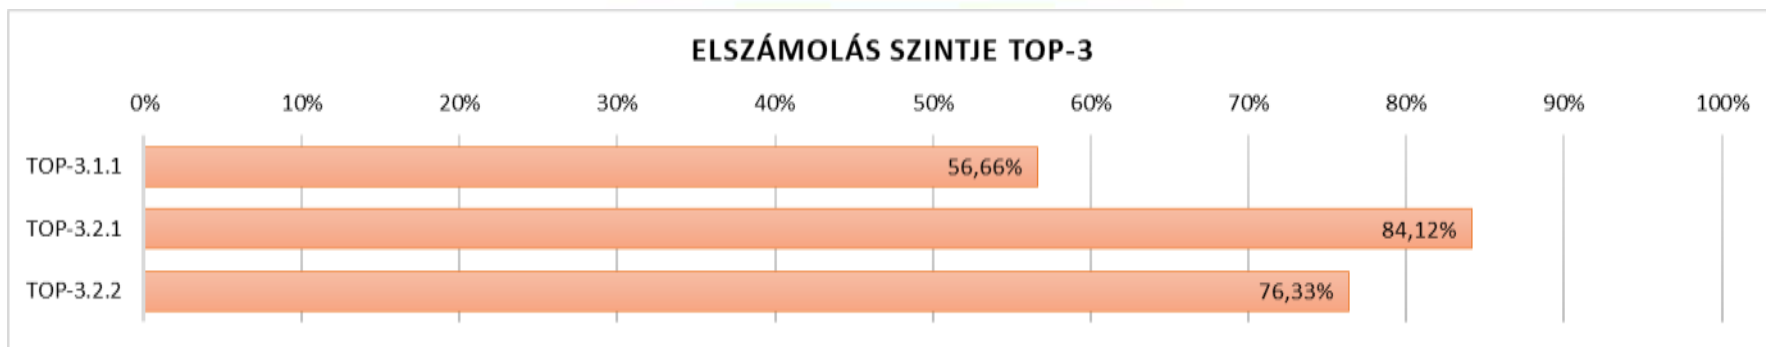


A TOP-3.1.1 felhívás 56%-on áll:

- 2020-ban kerültek nagyszámú támogatások megítélésre;
- komplexebb tervezést igénylő kerékpárút kiépítésére irányulnak,
- gyakran elhúzódó területszerzési és engedélyezési tevékenységgel.

Megvalósítás előrehaladása, TOP-4 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

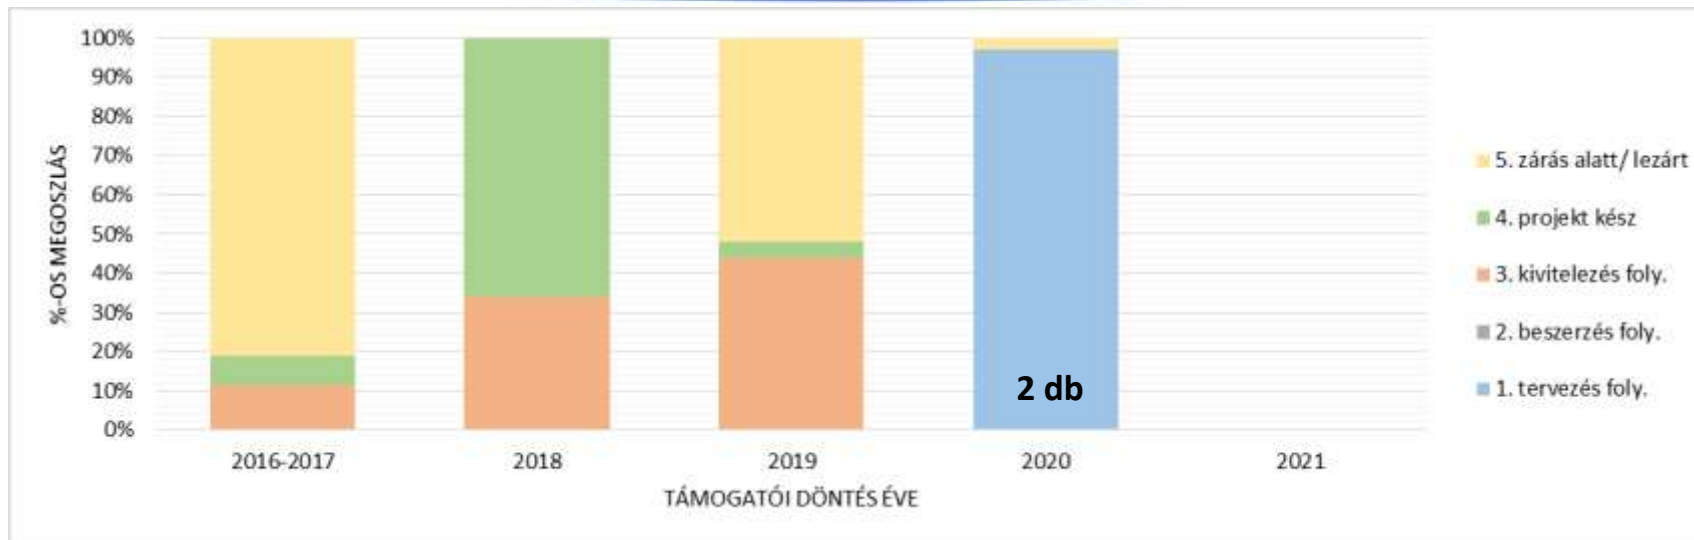


Békés	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
Fizikai előrehaladás	2016-2017	2018	2019	2020	2021
1. tervezés foly.	0	0	0	593 404 333	0
2. beszerzés foly.	0	0	0	0	0
3. kivitelezés foly.	485 107 818	77 994 000	90 736 831	0	0
4. projekt kész	335 105 476	150 965 140	8 700 000	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	3 484 464 743	0	107 199 936	17 000 000	0
Összesen	4 304 678 037	228 959 140	206 636 767	610 404 333	0


A TOP-4 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-4



TOP-4.3.1 döntések

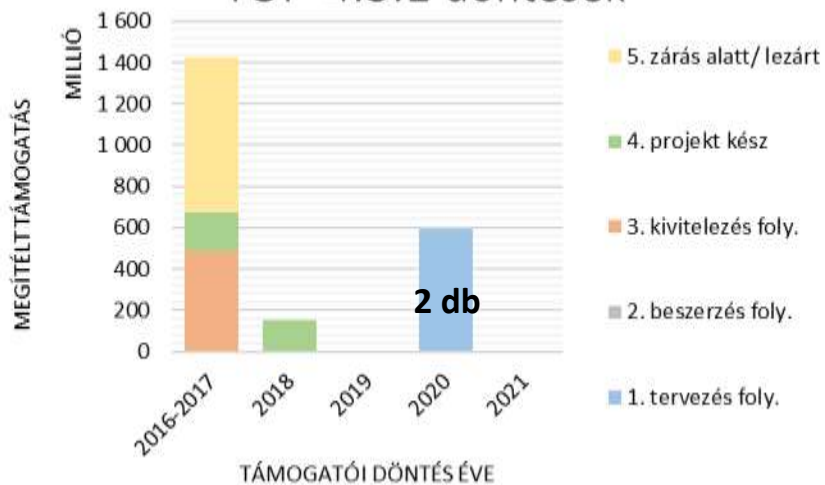


A 4.3.1 (leromlott városi területek rehabilitációja) felhívás 66,7%-on áll:

- 2db projektet támogattunk 2020-ban, ezek elszámolási szintje 0%, illetve 1%.

A TOP-5 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

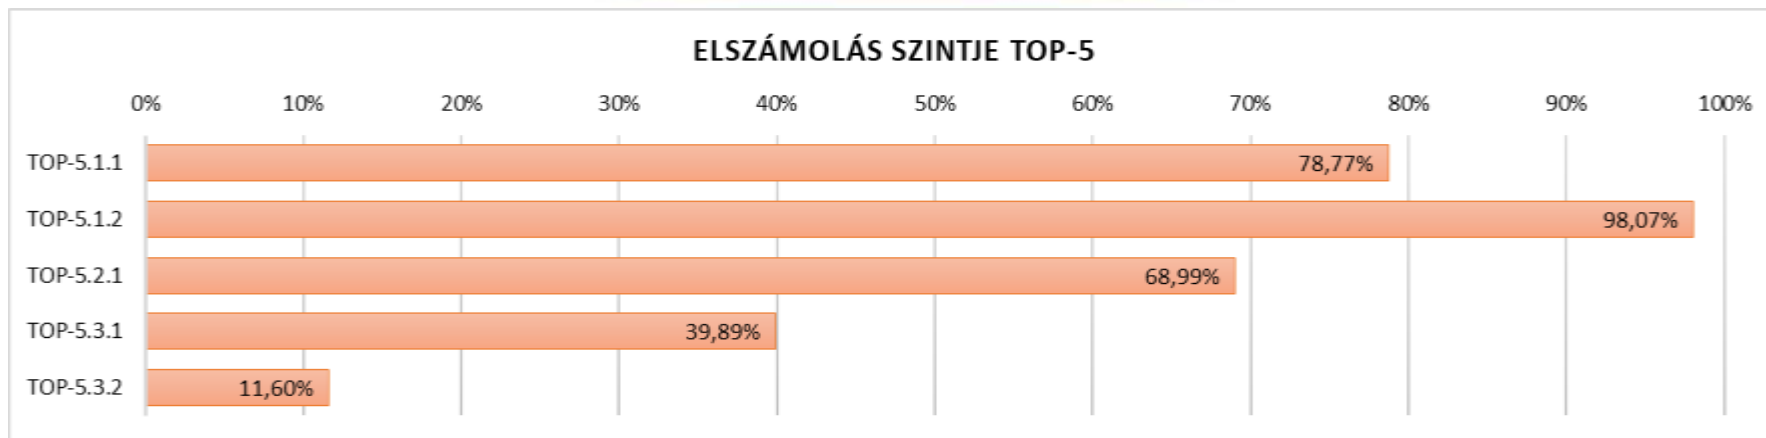

TOP-5.1.1 *megyei szintű foglalkoztatási együttműködések* c. felhívás 79%-on áll.

A TOP-5.1.2 *helyi szintű foglalkoztatási együttműködések* c. felhíváson támogatott 8 db projekt 2021-ben zár(t).

A TOP-5.2.1 *A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* c. felhíváson

- 9 db 2017-ben támogatott projekt van, 34-100%-os szinten;
- 2 db 2020-ben támogatott projekt van, 0% és 15%-os szinten.

A TOP-5.3.1 *A helyi identitás és kohézió erősítése* c. felhívás keretében

- 11 db 15-100 millió Ft közötti projektet támogattunk 2018-ban.
- Az átlagos elszámolási szint (40%) alatt 6 projekt van (ebből 1db 0%-on).

A TOP-5.3.2 *Megyei identitás erősítése* c. felhíváson a megyében 1 db 2019-ben támogatott projekt van, megvalósítása folyamatban, zárás 2023-ban várható.

Költségnövekmények

A megyékben eddig **126 db** TOP forrásból finanszírozott többlettámogatási igény pozitív elbírálásáról született IH döntés **2.74 Mrd Ft** értékben, további **11 db** kérelem feldolgozása folyamatban van, amelyből 1 db esetben látszik elakadás a kedvezményezett oldalán.

- Költségnövekmény-igény benyújtása esetén **az alábbiakat javasoljuk:**
 - **Előzetes egyeztetés** szükséges a területi szereplővel a forrásról
 - Amennyiben az elbírálás **során csökken a növekmény összege**, akkor **új testületi határozat** benyújtása szükséges az önerőről
 - Mérlegelni szükséges az **átfutási időt** és ennek fényében esetleg saját forrást is hozzátenni, mivel
 - 30% és 100 millió Ft alatti akkor IH hatáskör és **kb. 1-1,5 hónap**
 - ha kormányjóváhagyás szükséges, az **kb. 2-4 hónap**
 - **Feltételes közbeszerzési eljárás**
 - **Költségnövekmények** gyakori előfordulása miatt ajánlott
 - Ismételten nem szükséges lefolytatni a közbeszerzést, a **növekmény jóváhagyása után hatályba léphet** a vállalkozási szerződés

TOP jó gyakorlatok

1. Ipari parkok esetén a **bérbeadáshoz** az **IH előzetes hozzájárulása** szükséges
2. **Külső projektmenedzsment cég** alkalmazása esetén is kérjük a szoros nyomonkövetést
3. **Előzetes piackutatás** a beszerzések esetén
4. Közbeszerzési/beszerzési eljárás előtt a **műszaki tartalom jóváhagyatása** a KSZ-el (elszámolhatóság elősegítése érdekében)
5. A **szakhatósági hozzájárulások** esetében javasoljuk az eljárás előrehaladásának minél szorosabb nyomonkövetését
6. Javasoljuk a **költségnövekmények 30% és 100 millió Ft alatt** tartását a gyors elbírálás érdekében

Zárással kapcsolatos teendők

1. **Összes számla időközi kifizetési igénylésben** -> nullás záró
2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló **benyújtási határidejét a felhívás szabályozza** (utolsó mérőföldkő elérését követő ált. 90 nap, de legkésőbbi határidő: 2022.dec.31.)
3. **Jogerős használatbavételi engedély**, amennyiben releváns **működési engedély** (pl. óvoda, bölcsőde) benyújtása, amennyiben megszerzése nem fér bele a 2. pont szerinti határidőbe, akkor a záró beszámolóban az engedélyezési eljárás megindítását igazolja
4. Az **indikátorok** teljesítését az indikátordefiníciós adatlap szerinti **alátámasztó dokumentumokkal** a beszámolóban szükséges igazolni
5. Amennyiben a **támogatás meghatározásához CBA alapján utólagos megállapítást** választott a kedvezményezett, akkor az újraszámolást el kell végezni
6. **Fel nem használt előleg** visszafizetése; nyilatkozat a **fel nem használt támogatásról** való lemondásról



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
